

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES.

NO. DE OBRA

02492019000113

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEHUI PANGO

LOCALIDAD

TILICA

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F19-LP

COSTO DEL CONTRATO

\$

11,894,069.64

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

95.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

11,894,069.64

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

MÉTAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (74 SCALL), 74 CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 M3, 74 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS, SISTEMA DE TRATAMIENTO, TRAMPAS DE GRASAS, SISTEMA DE INTERCONEXIÓN, ACARREOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492019000002

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO SOLEDAD ATZOMPA

LOCALIDAD HUITZILA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2019-E01-LPE

REGIÓN LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 9,665,056.47

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 9,665,056.47

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ -

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL), INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (447.6 METROS) INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 32 MILÍMETROS, INSTALACIÓN DE CANOAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO COLONIAL, INSTALACIÓN DE 2,080.8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 75 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, CISTERNA DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 12.00 METROS CÚBICOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

NO. DE OBRA
02492019000004

LOCALIZACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO LOS REYES

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2019-E02-LPE

LOCALIDAD CUBANICUILCO

COSTO DEL CONTRATO \$ 6,900,369.54

REGIÓN LAS MONTAÑAS



AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 99.92%

DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019 \$ 6,894,766.22

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ 5,603.32

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL), INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (327 METROS) INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 32 MILÍMETROS, INSTALACIÓN DE CANOAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO COLONIAL, INSTALACIÓN DE 1,528.18 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 75 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, CISTERNA DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 5.0 METROS CÚBICOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

NO. DE OBRA
02492018000007



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	TEMPOAL
-----------	---------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2018-E04-LPE

LOCALIDAD	COROZAL
-----------	---------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 12,418,531.98
--------------------	------------------

REGIÓN	HUASTECA ALTA
--------	---------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	100.00%
-------------------	---------

DEVENGADO HASTA 2019	\$ 8,843,574.76
----------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020	\$ -
---------------	------

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2020	\$ -
----------------------	------

FECHA DE CORTE	31 DE ENERO DE 2020
----------------	---------------------

METAS

COLECTOR ZONA NORTE Y RED DE ATARJEAS ZONA NORTE (TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE 3,296 MTS. DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, 50 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA), COLECTOR ZONA CENTRO Y RED DE ATARJEAS ZONA CENTRO (TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE 1,809 MTS. DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, 41 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA), MALLA ELECTROSOLDADA, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 1,809 MTS. DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA HERMÉTICA, COLECTOR ZONA SUR Y RED DE ATARJEAS ZONA SUR (TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE 3,801 MTS. DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, 77 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA), DESCARGAS DOMICILIARIAS.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARIZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI

NO. DE OBRA
02492019000001

LOCALIZACIÓN

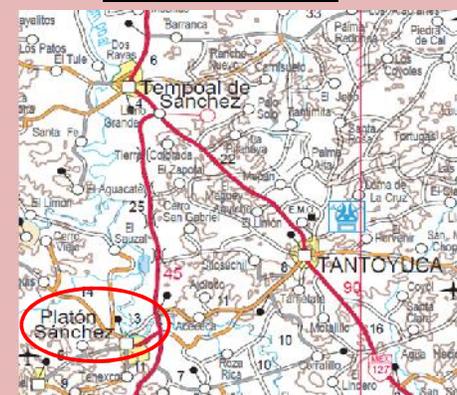

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO PLATÓN SÁNCHEZ

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2019-E03-LPE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 8,277,435.47

REGIÓN HUASTECA ALTA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 98.73%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 8,172,211.42

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ 105,224.05

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS


EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE CAPTACIÓN Y CASETA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL CÁRCAMO Y DERIVACIÓN A MONTE GRANDE, TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS Y CÁRCAMO DE REBOMBEO (ATEMPA Y TAMARIZINTLA), TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS (MONTE GRANDE), EQUIPAMIENTO MECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN Y CASETA DE REBOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO AL TANQUE TLALPAN, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30 METROS CÚBICOS (TLALPAN), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (MONTE GRANDE), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (ATEMPA Y TAMARIZINTLA).



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SIST. MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA) PARA LAS LOCS. DE LA UNIDAD, EL SABROSO UNO (CRUCERO EL PALMITO), SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA, EL COYOL, EL MEZQUI TE MANO DE LEÓN, SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, EL AGUACATE Y LA ESPERANZA DEL MPIO. DE TANTOYUCA, VER.

NO. DE OBRA
02492018000098

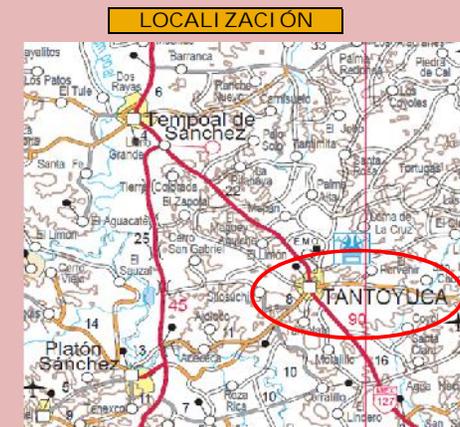

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TANTOYUCA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FONREGIÓN-2018-15-LP

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 24,683,024.07

REGIÓN HUASTECA ALTA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 24,683,024.07

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ -

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS

LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL REBOMBEO 1, TANQUE SUP. DE 50 M3 (REBOMBEO 1), SISTEMAS DE: SANTA CLARA, SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA Y EL COYOL, LÍNEAS DE DERIVACIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL REBOMBEO 2, TANQUE SUP. DE 30 M3 (REBOMBEO 2), SISTEMAS DE MEZQUITE, MANO DE LEÓN, SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, EL AGUACATE, LA ESPERANZA, SANTA CLARA, CRUCERO PALMITO, LÍNEAS DE DERIVACIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS, FONTANERÍA, CÁRCAMO, REBOMBEO 1 Y 2 E HINCADO HORIZONTAL.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (TERCERA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492018000083

LOCALIZACIÓN

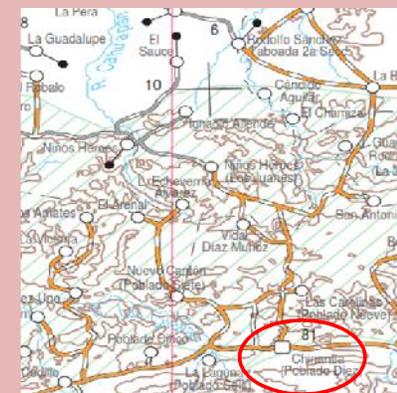

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO UXPANAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FONREGIÓN-2018-11-LP

LOCALIDAD POBLADO 10

COSTO DEL CONTRATO \$ 16,797,116.54

REGIÓN OLMECA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 54.07%

DEVENGADO HASTA 2019 \$ 9,081,935.05

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA Y PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MANO, REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90%, RELLENO DE ZANJAS, BOMBEO DE ACHIQUE), 13,363.38 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 Y 250 MILÍMETROS DE DIAMETRO, 134 POZOS DE VISITA, 385 DESCARGAS DOMICILIARIAS.



OBRA TERMINADA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492018000086

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO UXPANAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FONREGIÓN-2018-13-LP

LOCALIDAD HERMANOS CEDILLO (POBLADOS)

COSTO DEL CONTRATO \$ 25,883,625.05

REGIÓN OLMECA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 25,883,625.05

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ -

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020



METAS
COLECTOR PRINCIPAL (2,774.90 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 315 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, 51 POZOS DE VISITA), RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA DE 7.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR), 12,164.86 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 200 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, 187 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS.

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA

02492018000084

LOCALIZACIÓN

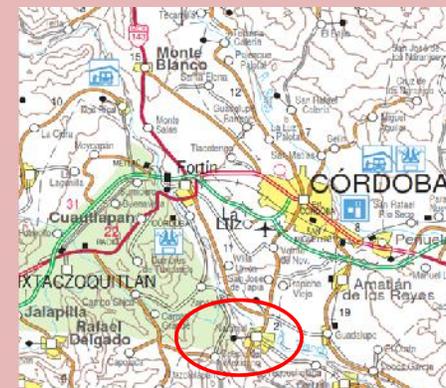

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

NARANJAL

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FONREGIÓN-2018-12-LP

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,910,611.65

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

80.00%

AVANCE FINANCIERO

7.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019

\$ 793,314.05

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REFRENDO 2020

\$ -

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

CÁRCAMO DE BOMBEO OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, 9,576.93 METROS LINEALES DE TUBERÍA, CASETA DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN TANQUE DE TRANSICIÓN, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, 2,563 BENEFICIARIOS, 2,177.11 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 600 TOMAS DOMICILIARIAS.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 CORTE AL 31 DE ENERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02492019000113	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD TILICA, MUNICIPIO DE TEHUIPANGO.	CAEV	0.00	11,894,069.64	95.00%	0.00%
02492019000001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARINZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ.	CAEV	8,172,211.42	105,224.05	100.00%	98.73%
02492019000004	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE CUBANICUICO MUNICIPIO DE LOS REYES.	CAEV	6,894,766.22	5,603.32	100.00%	99.92%
02492018000086	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD HERMANOS CEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.	CAEV	25,883,625.05	0.00	100.00%	100.00%
02492018000098	CONSTRUCCIÓN DEL SIST. MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA) PARA LAS LOCS. DE LA UNIDAD,EL SABROSO UNO (CRUCERO EL PALMITO),SAN ANTONIO,EL NOPAL,LA CHACA,EL COYOL,EL MEZQUITE MANO DE LEÓN,SANTA RITA,SAN JERÓNIMO,EL AGUACATE Y LA ESPERANZA DEL MPIO. DE TANTOYUCA, VER.	CAEV	24,683,024.07	0.00	100.00%	100.00%
02492019000002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	CAEV	9,665,056.47	0.00	100.00%	100.00%
02492018000083	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD POBLADO 10, EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.	CAEV	9,081,935.05	0.00	100.00%	54.07%
02492018000007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE COROZAL, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL.	CAEV	8,843,574.76	0.00	100.00%	100.00%
02492018000084	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE NARANJAL (TERMINACIÓN ANTICIPADA).	CAEV	793,314.05	0.00	80.00%	7.00%
		SUB-TOTAL:	94,017,507.09	12,004,897.01		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
