


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500.

NO. DE OBRA
04842018000019

LOCALIZACIÓN

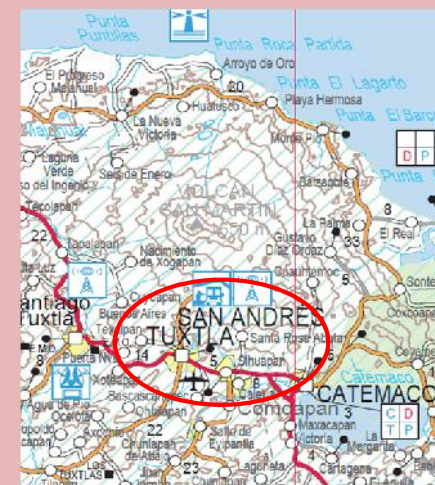

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO SAN ANDRÉS TUXTLA

LOCALIDAD VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-008/2018-DGCCYCE

REGIÓN LOS TUXTLAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 26,322,465.67

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 99.05%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 26,071,525.39

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO, LIMPIEZA DE CUNETA, CUNETAS), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR), SEÑALAMIENTO.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM. 9+000 AL KM. 18+000.

NO. DE OBRA
04842018000126

LOCALIZACIÓN

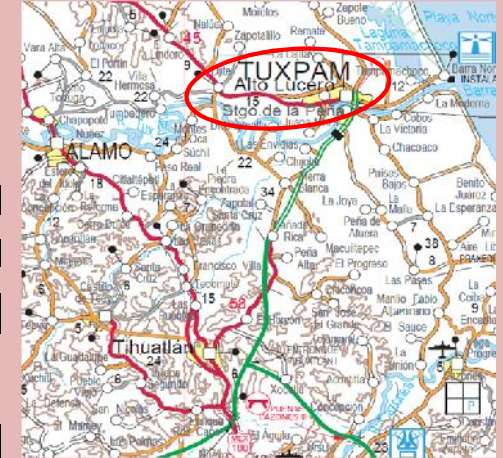

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TUXPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PE-142/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 42,697,771.70

REGIÓN HUASTECA BAJA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. HASTA 2019 \$ 42,697,284.87

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO EN CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE, SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO), SEÑALAMIENTO (PINTURA DE RAYA SENCILLA Y DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES Y CONTINUA EN ORILLA DE CALZADA), SEÑALES PREVENTIVA, RESTRICTIVA E INFORMATIVA.



OBRA TERMINADA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS DEL KM. 2+300 AL KM. 5+300.

NO. DE OBRA
04842018000169
04842019000066



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO VARIOS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-191/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 13,754,845.00

REGIÓN CAPITAL

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO HASTA EL 2019 \$ 13,754,845.00

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020



METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3RA. CLASE, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL FILTRO Y DRENES DE PVC DE 4 PULGADAS), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAÚLICO), PAVIMENTOS (RECORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 5 CENTÍMETROS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 3,240 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA, DEL KM. 1+500 AL KM. 2+570.

NO. DE OBRA
04842018000157

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TAMPICO ALTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-189/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 5,854,840.68

REGIÓN HUASTECA ALTA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO HASTA EL 2019 \$ 5,854,840.68

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS
TERRACERIAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO), DRENAJE Y SUBDRENAJE (CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, LAVADEROS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), PAVIMENTOS (RECORTES DE CAPAS EXISTENTES EN UN ESPESOR DE 33 CENTÍMETROS, CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 1,367 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO.



OBRA TERMINADA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100

NO. DE OBRA
04842019000030

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO SAN ANDRÉS TUXTLA

LOCALIDAD VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-006/2019-DGCCYCE

REGIÓN LOS TUXTLAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 20,867,559.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 95.34%

AVANCE FINANCIERO 58.97%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 12,306,166.20

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ 8,561,392.80

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS
TERRACERÍAS (DESPALMES, CORTES, TERRAPLENES), OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TIPO CAJÓN Y TUBULARES DE CONCRETO, VADO MONOLITICO CONSTRUIDO A NIVEL DE CAUCE, CUNETAS, BORDILLOS), PAVIMENTOS (SUBBASE HIDRÁULICA DE 24 CM DE ESPESOR, RIEGO E IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM), SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000

NO. DE OBRA

04842019000015

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEQUILA

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-071/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$

41,871,288.30

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

3.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

41,871,288.30

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 CONSISTENTE EN: TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO

NO. DE OBRA

04842019000100

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

SANTIAGO TUXTLA

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LOS TUXTLA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-069/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$

14,470,494.44

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

0.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

14,470,494.44

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO CONSISTENTE EN: GUARNICIÓN BANQUETA, PARAPETO Y REMATES, SUPERESTRUCTURA, CABALLETES, ACCESOS, PROTECCIÓN DE TERRAPLENES Y SEÑALAMIENTOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+500

NO. DE OBRA
04842019000046

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TLAPACOYAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-012/2019-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN NAUTLA

COSTO DEL CONTRATO \$ 16,695,761.80

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 98.50%

AVANCE FINANCIERO 96.51%

DEVENGADO HASTA EL 2019 \$ 16,113,250.01

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ 582,511.79

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020



METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE TALUDES), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO, BORDILLOS, LAVADEROS), PAVIMENTOS (DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CORTE DE CAPA EXISTENTE, SUB BASE DE 15 CM DE ESPESOR, RECUPERACIÓN EN FRÍO DE CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM, CARPETA ASFÁLTICA), SEÑALAMIENTO.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+800

NO. DE OBRA

04842019000014

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

ACTOPAN

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

CAPITAL

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-005/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 23,663,882.79

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

100.00%

AVANCE FINANCIERO

95.21%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019

\$ 22,529,297.77

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020

\$ 1,134,585.02

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

PRELIMINARES (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (RIEGO DE IMPREGNACIÓN, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA Densa DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS, BACHEO PROFUNDO EN TRAMOS AISLADOS), SEÑALAMIENTO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A IXHUAPAN PERTENECIENTE AL EJIDO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+410 AL KM 0+910, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 0+660 (PUENTE VADO)

NO. DE OBRA
04842019000075

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TATAHUICAPAN DE JUAREZ

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SI OP-OP-PF-007/2019-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN OLMECA

COSTO DEL CONTRATO \$ 1,428,528.34

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 1,428,526.88

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020



METAS
TERRACERÍAS (AFINAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE LOS ACCESOS DE ESTRUCTURA, INCLUYE REMOCIÓN DE MATERIALES PARA PERFILAR LAS SECCIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN MATERIAL TIPO C), CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO VADO (CONCRETO CICLÓPEO EN MUROS, CONCRETO HIDRÁULICO LIGERO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO).

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 12+770.

NO. DE OBRA
04842018000172
04842018000163



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO PUEBLO VIEJO

LOCALIDAD PUEBLO VIEJO

REGIÓN HUASTECA ALTA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SI OP-OP-PF-196/2018-DGCCYCE
SI OP-OP-PF-197/2018-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO \$ 24,346,129.62

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 24,344,279.69

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ -

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS
TERRACERÍAS (SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO, EN UN ESPESOR DE 35 CENTÍMETROS), ESTRUCTURAS (GUARNICIONES Y BANQUETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA INCLUYE BROCAL Y TAPAS, CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR DE 80 x 80 x 100 CENTÍMETROS), PAVIMENTOS (RETIRO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, ESCARIFICADO DE CAPA EXISTENTE, CAPA ESTABILIZADA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4,114.95 METROS CÚBICOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100

NO. DE OBRA

04842019000083

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

POZA RICA DE HIDALGO

LOCALIDAD

POZA RICA

REGIÓN

TOTONACA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PE-068/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,084,949.84

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

18.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$ 11,084,949.84

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100 CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO, CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ENTRONQUE DE CALLES Y FRANJAS A NIVEL, BANQUETAS, GUARNICIONES, ÁREAS DE ACOTAMIENTO, SEÑALAMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN.



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS

NO. DE OBRA

04842019000094

LOCALIZACIÓN

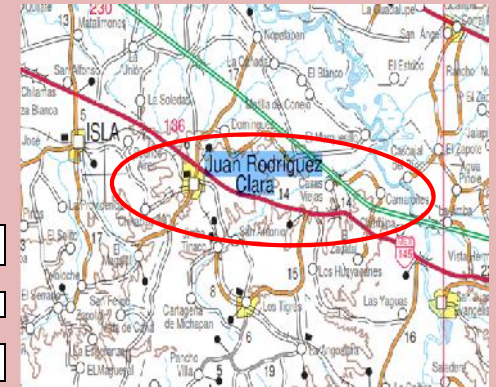

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

JUAN RODRIGUEZ CLARA

LOCALIDAD

MIGUEL HIDALGO

REGIÓN

PAPALOAPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PE-079/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$

12,742,558.77

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

18.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

12,742,558.77

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS CONSISTENTE EN: GUARNICIONES, BANQUETAS, PARAPETO Y REMATES, SUPERESTRUCTURA, CABALLETES, RAMPAS DE ACCESOS, PROTECCIÓN DE TERRAPLENES Y SEÑALAMIENTOS.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
CORTE AL 31 DE ENERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
04842019000015	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEQUILA.	SIOP	0.00	41,871,288.30	3.00%	0.00%
04842019000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA.	SIOP	0.00	14,470,494.44	0.00%	0.00%
04842019000094	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA.	SIOP	0.00	12,742,558.77	18.00%	0.00%
04842019000083	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM. 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA.	SIOP	0.00	11,084,949.84	18.00%	0.00%
04842019000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES TUXTLA.	SIOP	12,306,166.20	8,561,392.80	95.34%	58.97%
04842019000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN.	SIOP	22,529,297.77	1,134,585.02	100.00%	95.21%
04842019000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN.	SIOP	16,113,250.01	582,511.79	98.50%	96.51%
04842018000169	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS DEL KM. 2+300 AL KM. 5+300, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	13,754,845.00	0.00	100.00%	100.00%
04842019000066						
04842018000172 04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 12+770, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO.	SIOP	24,344,279.69	0.00	100.00%	100.00%
04842018000157	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA, DEL KM. 1+500 AL KM. 2+570, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO.	SIOP	5,854,840.68	0.00	100.00%	100.00%
04842019000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A IXHUAPAN PERTENECIENTE AL EJIDO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+410 AL KM 0+910, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 0+660 (PUENTE VADO), EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ.	SIOP	1,428,526.88	0.00	100.00%	100.00%
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.	SIOP	26,071,525.39	0.00	100.00%	99.05%
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM. 9+000 AL KM. 18+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN.	SIOP	42,697,284.87	0.00	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL	165,100,016.49	90,447,780.96		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
