

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES.

NO. DE OBRA

02492019000113

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEHUIPANGO

LOCALIDAD

TILICA

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2019-F19-LP

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,894,069.64

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

95.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$ 11,894,069.64

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

MÉTAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (74 SCALL), 74 CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 M3, 74 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS, SISTEMA DE TRATAMIENTO, TRAMPAS DE GRASAS, SISTEMA DE INTERCONEXIÓN, ACARREOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

NO. DE OBRA
02492019000004

LOCALIZACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO LOS REYES

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2019-E02-LPE

LOCALIDAD CUBANI CUILCO

COSTO DEL CONTRATO \$ 6,900,369.54

REGIÓN LAS MONTAÑAS



AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 99.92%

DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019 \$ 6,894,766.22

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ 5,603.32

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL), INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (327 METROS) INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 32 MILÍMETROS, INSTALACIÓN DE CANOAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO COLONIAL, INSTALACIÓN DE 1,528.18 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 75 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, CISTERNA DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 5.0 METROS CÚBICOS.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARIZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI

NO. DE OBRA
02492019000001

LOCALIZACIÓN

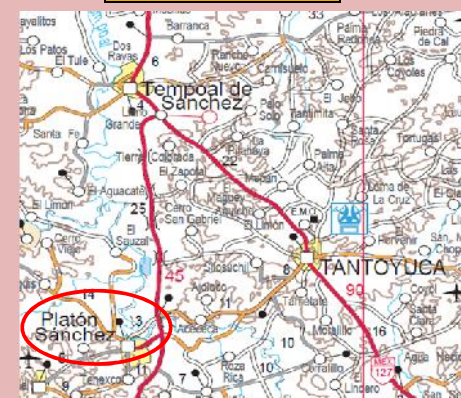

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO PLATÓN SÁNCHEZ

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2019-E03-LPE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 8,277,435.47

REGIÓN HUASTECA ALTA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 98.73%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 8,172,211.42

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ 105,224.05

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE CAPTACIÓN Y CASETA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL CÁRCAMO Y DERIVACIÓN A MONTE GRANDE, TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS Y CÁRCAMO DE REBOMBEO (ATEMPA Y TAMARIZINTLA), TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS (MONTE GRANDE), EQUIPAMIENTO MECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN Y CASETA DE REBOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO AL TANQUE TLALPAN, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30 METROS CÚBICOS (TLALPAN), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (MONTE GRANDE), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (ATEMPA Y TAMARIZINTLA).





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2020



| OBRA | | UNIDAD PRESUPUESTAL | MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019 | APROBADO 2020 (en Pesos) | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| No. de Obra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | | | | | |
| 02492019000113 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD TILICA, MUNICIPIO DE TEHUIPANGO. | CAEV | 0.00 | 11,894,069.64 | 95.00% | 0.00% |
| 02492019000001 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARINZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ. | CAEV | 8,172,211.42 | 105,224.05 | 100.00% | 98.73% |
| 02492019000004 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE CUBANICUICO MUNICIPIO DE LOS REYES. | CAEV | 6,894,766.22 | 5,603.32 | 100.00% | 99.92% |
| | | SUB-TOTAL: | 15,066,977.64 | 12,004,897.01 | | |

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
