

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE DOS NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EI T0009M.

NO. DE OBRA

02082018000222

LOCALIZACIÓN

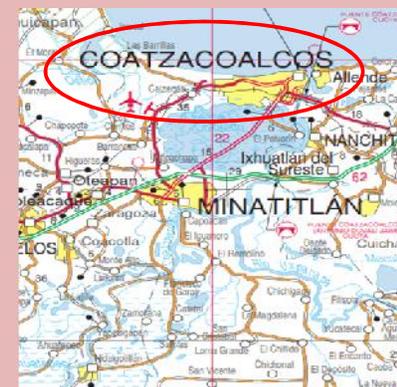

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

COATZACOALCOS

LOCALIDAD

COATZACOALCOS

REGIÓN

SOTAVENTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FONREGIÓN-001-19

COSTO DEL CONTRATO

\$ 19,964,000.83

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

99.00%

AVANCE FINANCIERO

62.59%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 19,964,000.83

DEVENGADO EN 2019

\$ 12,495,414.98

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

EDIFICIO "O" (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO Y TABLEROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA, RED REGULADA LAB. DIGITAL 1, RED DE DATOS LAB. DIGITAL1, 2, 3 Y 4, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO, HIDRÁULICA Y SANITARIA), EDIFICIO "P" (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO Y TABLEROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA, RED REGULADA LAB. DIGITAL 1, RED DE DATOS LAB. DIGITAL1, 2, 3 Y 4, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO, HIDRÁULICA Y SANITARIA), OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, MURO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, CUBIERTA, BARDA PERIMETRAL.



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.

NO. DE OBRA

02082017000243

LOCALIZACIÓN

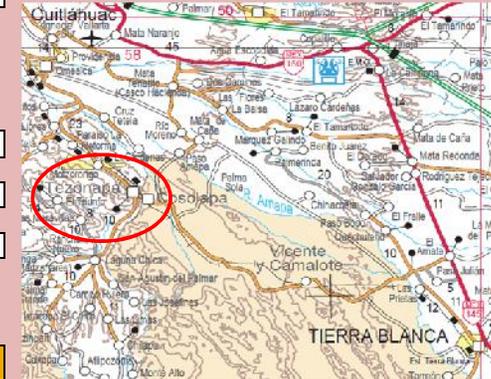

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEZONAPA

LOCALIDAD

TEZONAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FONR-134-17

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,796,610.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

69.00%

AVANCE FINANCIERO

46.55%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018

\$ 5,492,017.12

AUTORIZADO EN 2019

\$ 3,152,296.42

DEVENGADO EN 2019

\$ -

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

EDIFICIO F (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MURO DE ACOMETIDA (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MEDIA TENSIÓN (CIMENTACIÓN, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN).



TERMINACIÓN ANTICIPADA



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 CORTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018	APROBADO 2019 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02082018000222	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE DOS NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EIT0009M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE COATZACOALCOS.	IEEV	0.00	19,964,000.83	99.00%	62.59%
02082017000243	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA. (OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA).	IEEV	5,492,017.12	3,152,296.42	69.00%	46.55%
		SUB-TOTAL:	5,492,017.12	23,116,297.25		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
