

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C (PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ LUIS MARTINEZ AGUILAR CLAVE 30ETV0482L.

NO. DE OBRA

02082019000254

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

MEDELLÍN

LOCALIDAD

FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FAMB-225-19

COSTO DEL CONTRATO

\$

4,940,825.78

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

10.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

4,940,825.78

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL,



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE DOS NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EI T0009M.

NO. DE OBRA

02082018000222

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

COATZACOALCOS

LOCALIDAD

COATZACOALCOS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FONREGIÓN-001-19

REGIÓN

SOTAVENTO

COSTO DEL CONTRATO

\$ 19,964,000.83

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

100.00%

AVANCE FINANCIERO

99.95%

DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019

\$ 19,954,215.06

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

REFRENDO 2020

\$ 9,785.77

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

EDIFICIO "O" (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO Y TABLEROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA, RED REGULADA LAB. DIGITAL 1, RED DE DATOS LAB. DIGITAL1, 2, 3 Y 4, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO, HIDRÁULICA Y SANITARIA), EDIFICIO "P" (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO Y TABLEROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA, RED REGULADA LAB. DIGITAL 1, RED DE DATOS LAB. DIGITAL1, 2, 3 Y 4, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO, HIDRÁULICA Y SANITARIA), OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, MURO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, CUBIERTA, BARDA PERIMETRAL.



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.

NO. DE OBRA

02082017000243

LOCALIZACIÓN

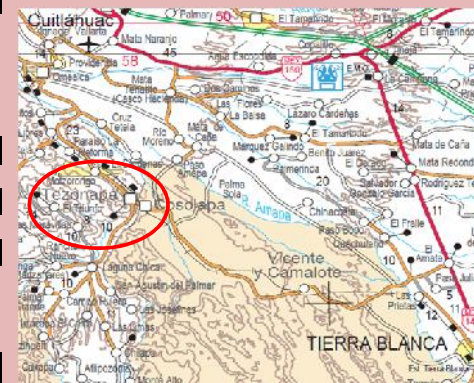

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEZONAPA

LOCALIDAD

TEZONAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FONR-134-17

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,796,610.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

69.00%

AVANCE FINANCIERO

46.56%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019

\$ 5,492,017.12

REFRENDO 2020

\$ 3,152,296.42

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

EDIFICIO F (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MURO DE ACOMETIDA (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MEDIA TENSIÓN (CIMENTACIÓN, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN).



TERMINACIÓN ANTICIPADA



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02082019000254	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C (PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ LUIS MARTÍNEZ AGUILAR CLAVE 30ETV0482L, EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO, MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO.	IEEV	0.00	4,940,825.78	10.00%	0.00%
02082017000243	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA. (OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA).	IEEV	5,492,017.12	3,152,296.42	69.00%	46.56%
02082018000222	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE DOS NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EIT0009M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE COATZACOALCOS.	IEEV	19,954,215.06	9,785.77	100.00%	99.95%
		SUB-TOTAL:	25,446,232.18	8,102,907.97		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
