

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C (PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ LUIS MARTINEZ AGUILAR CLAVE 30ETV0482L.

NO. DE OBRA

02082019000254

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

MEDELLÍN

LOCALIDAD

FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FAMB-225-19

COSTO DEL CONTRATO

\$

4,940,825.78

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

10.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

4,940,825.78

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL,



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.

NO. DE OBRA

02082017000243

LOCALIZACIÓN

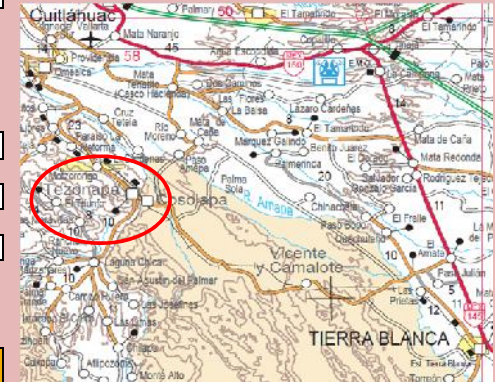

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEZONAPA

LOCALIDAD

TEZONAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FONR-134-17

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,796,610.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

69.00%

AVANCE FINANCIERO

46.56%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019

\$ 5,492,017.12

REFRENDO 2020

\$ 3,152,296.42

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

EDIFICIO F (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MURO DE ACOMETIDA (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MEDIA TENSIÓN (CIMENTACIÓN, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN).





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
 CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02082019000254	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C (PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ LUIS MARTÍNEZ AGUILAR CLAVE 30ETV0482L, EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO, MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO.	IEEV	0.00	4,940,825.78	10.00%	0.00%
02082017000243	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA. (OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA).	IEEV	5,492,017.12	3,152,296.42	69.00%	46.56%
		SUB-TOTAL:	5,492,017.12	8,093,122.20		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
