

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100

NO. DE OBRA

04842019000083

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

POZA RICA DE HIDALGO

LOCALIDAD

POZA RICA

REGIÓN

TOTONACA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PE-068/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$

11,084,949.84

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

18.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

11,084,949.84

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100 CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO, CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ENTRONQUE DE CALLES Y FRANJAS A NIVEL, BANQUETAS, GUARNICIONES, ÁREAS DE ACOTAMIENTO, SEÑALAMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN.



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS

NO. DE OBRA

04842019000094

LOCALIZACIÓN

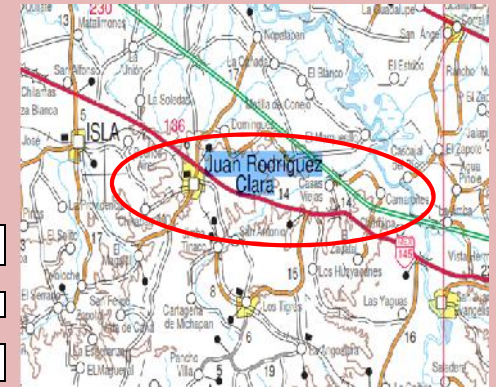

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

JUAN RODRIGUEZ CLARA

LOCALIDAD

MIGUEL HIDALGO

REGIÓN

PAPALOAPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PE-079/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$

12,742,558.77

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

18.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

12,742,558.77

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS CONSISTENTE EN: GUARNICIONES, BANQUETAS, PARAPETO Y REMATES, SUPERESTRUCTURA, CABALLETES, RAMPAS DE ACCESOS, PROTECCIÓN DE TERRAPLENES Y SEÑALAMIENTOS.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+800

NO. DE OBRA
04842019000014

LOCALIZACIÓN

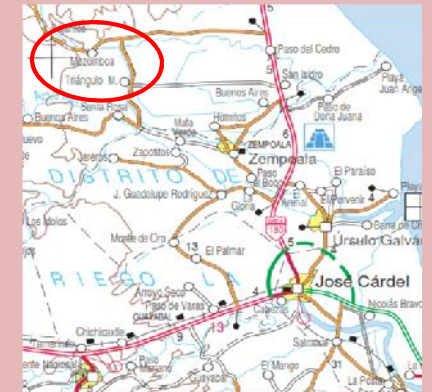

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO ACTOPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-005/2019-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN CAPITAL

COSTO DEL CONTRATO \$ 23,663,882.79

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 95.21%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 22,529,297.77

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ 1,134,585.02

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

PRELIMINARES (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (RIEGO DE IMPREGNACIÓN, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA Densa DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS, BACHEO PROFUNDO EN TRAMOS AISLADOS), SEÑALAMIENTO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+500

NO. DE OBRA
04842019000046

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TLAPACOYAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-012/2019-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN NAUTLA

COSTO DEL CONTRATO \$ 16,695,761.80

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 98.50%

AVANCE FINANCIERO 96.51%

DEVENGADO HASTA EL 2019 \$ 16,113,250.01

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ 582,511.79

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020



METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE TALUDES), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO, BORDILLOS, LAVADEROS), PAVIMENTOS (DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CORTE DE CAPA EXISTENTE, SUB BASE DE 15 CM DE ESPESOR, RECUPERACIÓN EN FRÍO DE CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM, CARPETA ASFÁLTICA), SEÑALAMIENTO.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO

NO. DE OBRA

04842019000100

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

SANTIAGO TUXTLA

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LOS TUXTLA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-069/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$

14,470,494.44

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

0.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

14,470,494.44

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO CONSISTENTE EN: GUARNICIÓN BANQUETA, PARAPETO Y REMATES, SUPERESTRUCTURA, CABALLETES, ACCESOS, PROTECCIÓN DE TERRAPLENES Y SEÑALAMIENTOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000

NO. DE OBRA
04842019000015

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TEQUILA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-071/2019-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 41,871,288.30

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 3.00%

AVANCE FINANCIERO 0.00%

AUTORIZADO EN 2020 \$ 41,871,288.30

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

METAS
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 CONSISTENTE EN: TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100

NO. DE OBRA
04842019000030

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO SAN ANDRÉS TUXTLA

LOCALIDAD VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-006/2019-DGCCYCE

REGIÓN LOS TUXTLAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 20,867,559.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 95.34%

AVANCE FINANCIERO 58.97%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 12,306,166.20

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REFRENDO 2020 \$ 8,561,392.80

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

METAS
TERRACERÍAS (DESPALMES, CORTES, TERRAPLENES), OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TIPO CAJÓN Y TUBULARES DE CONCRETO, VADO MONOLITICO CONSTRUIDO A NIVEL DE CAUCE, CUNETAS, BORDILLOS), PAVIMENTOS (SUBBASE HIDRÁULICA DE 24 CM DE ESPESOR, RIEGO E IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM), SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
04842019000015	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUIPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEQUILA.	SIOP	0.00	41,871,288.30	3.00%	0.00%
04842019000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA.	SIOP	0.00	14,470,494.44	0.00%	0.00%
04842019000094	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA.	SIOP	0.00	12,742,558.77	18.00%	0.00%
04842019000083	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM. 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE POZA RICA.	SIOP	0.00	11,084,949.84	18.00%	0.00%
04842019000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES TUXTLA.	SIOP	12,306,166.20	8,561,392.80	95.34%	58.97%
04842019000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN.	SIOP	22,529,297.77	1,134,585.02	100.00%	95.21%
04842019000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN.	SIOP	16,113,250.01	582,511.79	98.50%	96.51%
		SUB-TOTAL	50,948,713.98	90,447,780.96		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
