

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA).

NO. DE OBRA

02492019000002

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

SOLEDAD ATZOMPA

LOCALIDAD

HUITZILA

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2019-E01-LPE

COSTO DEL CONTRATO

\$

9,665,056.47

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

95.00%

AVANCE FINANCIERO

72.45%

AUTORIZADO EN 2019

\$

9,665,056.47

DEVENGADO EN 2019

\$

7,002,003.13

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL), INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (447.6 METROS) INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 32 MILÍMETROS, INSTALACIÓN DE CANOAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO COLONIAL, INSTALACIÓN DE 2,080.8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 75 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, CISTERNA DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 12.00 METROS CÚBICOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

NO. DE OBRA

02492019000004

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

LOS REYES

LOCALIDAD

CUBANI CUILCO

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2019-E02-LPE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 6,900,369.54

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

97.00%

AVANCE FINANCIERO

82.70%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 6,900,369.54

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2019

\$ 5,706,477.34

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS


SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL), INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (327 METROS) INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 32 MILÍMETROS, INSTALACIÓN DE CANOAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO COLONIAL, INSTALACIÓN DE 1,528.18 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 75 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, CISTERNA DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 5.0 METROS CÚBICOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

NO. DE OBRA
02492018000007

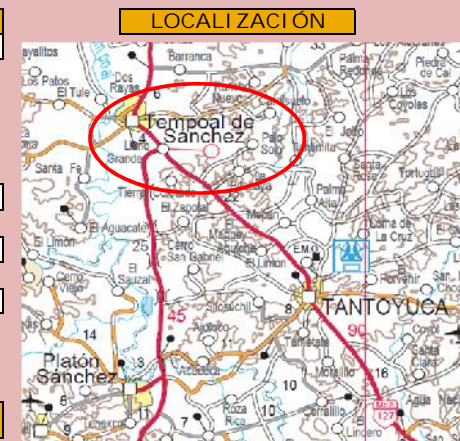

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	TEMPOAL
-----------	---------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2018-E04-LPE

LOCALIDAD	COROZAL
-----------	---------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 12,418,531.98
--------------------	------------------

REGIÓN	HUASTECA ALTA
--------	---------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	100.00%
-------------------	---------

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018	\$ 5,157,717.09
-------------------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA

AUTORIZADO EN 2019	\$ 3,685,857.67
--------------------	-----------------

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2019	\$ 3,685,857.67
----------------------	-----------------

FECHA DE CORTE	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
----------------	-------------------------

METAS

COLECTOR ZONA NORTE Y RED DE ATARJEAS ZONA NORTE (TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE 3,296 MTS. DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, 50 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA), COLECTOR ZONA CENTRO Y RED DE ATARJEAS ZONA CENTRO (TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE 1,809 MTS. DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, 41 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA), MALLA ELECTROSOLDADA, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 1,809 MTS. DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA HERMÉTICA, COLECTOR ZONA SUR Y RED DE ATARJEAS ZONA SUR (TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE 3,801 MTS. DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, 77 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA), DESCARGAS DOMICILIARIAS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARINZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI

NO. DE OBRA

02492019000001

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

PLATÓN SÁNCHEZ

LOCALIDAD

VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2019-E03-LPE

REGIÓN

HUASTECA ALTA

COSTO DEL CONTRATO

\$ 6,621,948.43

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

99.00%

AVANCE FINANCIERO

99.86%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 6,621,948.43

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2019

\$ 6,612,954.58

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE CAPTACIÓN Y CASETA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL CÁRCAMO Y DERIVACIÓN A MONTE GRANDE, TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS Y CÁRCAMO DE REBOMBEO (ATEMPA Y TAMARITZINTLA), TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS (MONTE GRANDE), EQUIPAMIENTO MECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN Y CASETA DE REBOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO AL TANQUE TLALPAN, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30 METROS CÚBICOS (TLALPAN), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (MONTE GRANDE), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (ATEMPA Y TAMARITZINTLA).



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SIST. MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA) PARA LAS LOCS. DE LA UNIDAD, EL SABROSO UNO (CRUCERO EL PALMITO), SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA, EL COYOL, EL MEZQUITE MANO DE LEÓN, SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, EL AGUACATE Y LA ESPERANZA DEL MPIO. DE TANTOYUCA, VER.

NO. DE OBRA

02492018000098

LOCALIZACIÓN

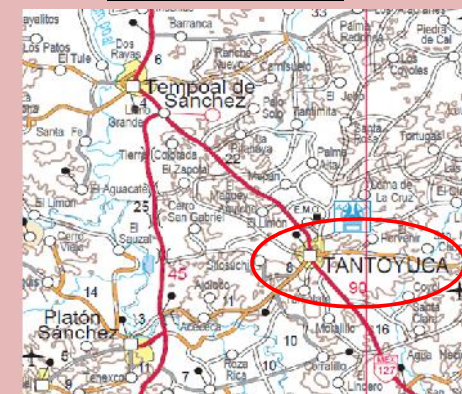

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TANTOYUCA

LOCALIDAD

VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FONREGIÓN-2018-15-LP

REGIÓN

HUASTECA ALTA

COSTO DEL CONTRATO

\$ 24,683,024.07

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

95.00%

AVANCE FINANCIERO

79.24%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 24,683,024.07

UNI DAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2019

\$ 19,557,693.32

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL REBOMBEO 1, TANQUE SUP. DE 50 M3 (REBOMBEO 1), SISTEMAS DE: SANTA CLARA, SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA Y EL COYOL, LÍNEAS DE DERIVACIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL REBOMBEO 2, TANQUE SUP. DE 30 M3 (REBOMBEO 2), SISTEMAS DE MEZQUITE, MANO DE LEÓN, SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, EL AGUACATE, LA ESPERANZA, SANTA CLARA, CRUCERO PALMITO, LÍNEAS DE DERIVACIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS, FONTANERÍA, CÁRCAMO, REBOMBEO 1 Y 2 E HINCADO HORIZONTAL.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (TERCERA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492018000083

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO UXPANAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FONREGIÓN-2018-11-LP

LOCALIDAD POBLADO 10

COSTO DEL CONTRATO \$ 16,797,116.54

REGIÓN OLMECA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO EN EL 2018 \$ 3,056,362.20

AUTORIZADO EN 2019 \$ 6,025,572.85

DEVENGADO EN 2019 \$ 6,025,572.85

FECHA DE CORTE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS
RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA Y PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MANO, REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90%, RELLENO DE ZANJAS, BOMBEO DE ACHIQUE), 13,363.38 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 Y 250 MILÍMETROS DE DIAMETRO, 134 POZOS DE VISITA, 385 DESCARGAS DOMICILIARIAS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492018000086

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO UXPANAPA

LOCALIDAD HERMANOS CEDILLO (POBLADOS)

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FONREGIÓN-2018-13-LP

REGIÓN OLMECA

COSTO DEL CONTRATO \$ 25,883,625.05

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

AUTORIZADO EN 2019 \$ 25,883,625.05

UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2019 \$ 25,883,625.05

FECHA DE CORTE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS
COLECTOR PRINCIPAL (2,774.90 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 315 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, 51 POZOS DE VISITA), RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA DE 7.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR), 12,164.86 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 200 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, 187 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA

02492018000084

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

NARANJAL

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FONREGIÓN-2018-12-LP

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,910,611.65

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

80.00%

AVANCE FINANCIERO

7.00%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 793,314.05

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2019

\$ 793,314.05

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

CÁRCAMO DE BOMBEO OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, 9,576.93 METROS LINEALES DE TUBERÍA, CASETA DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN TANQUE DE TRANSICIÓN, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, 2,563 BENEFICIARIOS, 2,177.11 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 600 TOMAS DOMICILIARIAS.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 CORTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018	APROBADO 2019 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02492018000086	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD HERMANOS CEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.	CAEV	0.00	25,883,625.05	100.00%	100.00%
02492018000098	CONSTRUCCIÓN DEL SIST. MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA) PARA LAS LOCS. DE LA UNIDAD,EL SABROSO UNO (CRUCERO EL PALMITO),SAN ANTONIO,EL NOPAL,LA CHACA,EL COYOL,EL MEZQUITE MANO DE LEÓN,SANTA RITA,SAN JERÓNIMO,EL AGUACATE Y LA ESPERANZA DEL MPIO. DE TANTOYUCA, VER.	CAEV	0.00	24,683,024.07	95.00%	79.24%
02492019000002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	CAEV	0.00	9,665,056.47	95.00%	72.45%
02492019000004	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE CUBANICUICO MUNICIPIO DE LOS REYES.	CAEV	0.00	6,900,369.54	97.00%	82.70%
02492019000001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARINZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ.	CAEV	0.00	6,621,948.43	99.00%	99.86%
02492018000083	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD POBLADO 10, EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.	CAEV	3,056,362.20	6,025,572.85	100.00%	100.00%
02492018000007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE COROZAL, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL.	CAEV	5,157,717.09	3,685,857.67	100.00%	100.00%
02492018000084	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE NARANJAL (TERMINACIÓN ANTICIPADA).	CAEV	0.00	793,314.05	80.00%	7.00%
		SUB-TOTAL:	8,214,079.29	84,258,768.13		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
