


DATOS GENERALES DE LA OBRA

**OBRA**  
AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA, CEYE, URGENCIAS Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL.

**NO. DE OBRA**  
02022018000020

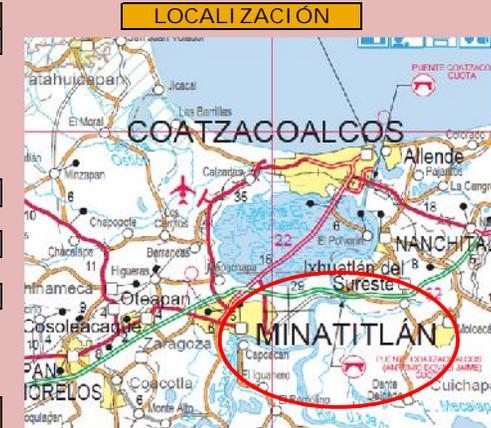

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**  
CONTRATO

**MUNICIPIO** MINATITLÁN

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**  
SESVER-DIS-FAFEF-2018-014-LPE

**LOCALIDAD** MINATITLÁN

**COSTO DEL CONTRATO** \$ 25,000,071.18

**REGIÓN** OLMECA

AVANCES

**AVANCE FÍSICO U.P.** 32.70%

**AVANCE FINANCIERO** 32.70%

**DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018** \$ 8,176,379.78

UNIDAD EJECUTORA  
**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

**AUTORIZADO EN 2019** \$ 5,047,107.41

**DEVENGADO EN 2019** \$ -

**FECHA DE CORTE** 29 DE NOVIEMBRE DE 2019



**METAS**  
PRELIMINARES, TERRACERÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

**OBRA**  
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIA, NEONATOLOGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL.

**NO. DE OBRA**  
02022018000017



**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**  
CONTRATO

**MUNICIPIO** POZA RICA

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**  
SESVER-DIS-FOBIRE-2018-006-AD-EXC

**LOCALIDAD** POZA RICA

**COSTO DEL CONTRATO** \$ 22,524,381.94

**REGIÓN** TOTONACA

AVANCES

**AVANCE FÍSICO U.P.** 100.00%

**AVANCE FINANCIERO** 100.00%

**DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018** \$ 22,517,596.75

UNIDAD EJECUTORA

**AUTORIZADO EN 2019** \$ 6,785.19

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

**DEVENGADO EN 2019** \$ -

**FECHA DE CORTE** 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

**METAS**

PRELIMINARES, TERRACERÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA METÁLICA, ALUMINIO, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, OBRA EXTERIOR, JARDINERÍA, MOBILIARIO DE ACERO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD "GASTÓN MELO"

NO. DE OBRA
02022019000212

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	XALAPA
-----------	--------

LOCALIDAD	XALAPA
-----------	--------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-REFIPE-2019-022-ICTP

REGIÓN	CAPITAL
--------	---------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 7,326,500.18
--------------------	-----------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	57.89%
-------------------	--------

AUTORIZADO EN 2019	\$ 7,326,500.18
--------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
------------------	--------------------------------

DEVENGADO EN 2019	\$ 4,241,257.28
-------------------	-----------------

FECHA DE CORTE	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
----------------	-------------------------

METAS
RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADO, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, HERRERÍA, CANCELERÍA, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, NUEVA IMAGEN, PROTECCIÓN CIVIL, VARIOS, AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA FINAL. TERMINACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PRELIMINARES, TRANSICIÓN AEREO - SUBTERRANEA, TRANSFORMADOR, DISPOSITIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA) Y AMPLIACIÓN.





## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018	APROBADO 2019 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ					
02022019000212	REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD "GASTÓN MELO", EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	0.00	7,326,500.18	100.00%	57.89%
02022018000020	AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA, CEYE, URGENCIAS Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN (EN PROCESO DE RESCISIÓN).	SESVER	8,176,379.78	5,047,107.41	32.70%	32.70%
02022018000017	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIA, NEONATOLOGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.	SESVER	22,517,596.75	6,785.19	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL:	30,693,976.53	12,380,392.78		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
