

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 12+770.

NO. DE OBRA

04842018000172
04842018000163

LOCALIZACIÓN

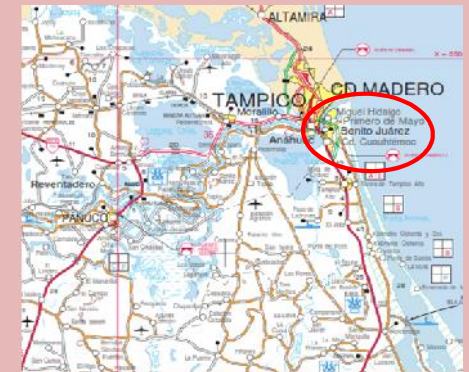

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

PUEBLO VIEJO

LOCALIDAD

PUEBLO VIEJO

REGIÓN

HUASTECA ALTA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SI OP-OP-PF-196/2018-DGCCYCE
SI OP-OP-PF-197/2018-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO \$ 24,346,129.62

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

AUTORIZADO EN 2019 \$ 24,344,279.69

UNIDAD EJECUTORA

DEVENGADO EN 2019 \$ 24,344,279.69

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

TERRACERÍAS (SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO, EN UN ESPESOR DE 35 CENTÍMETROS), ESTRUCTURAS (GUARNICIONES Y BANQUETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA INCLUYE BROCAL Y TAPAS, CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR DE 80 x 80 x 100 CENTÍMETROS), PAVIMENTOS (RETIRO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, ESCARIFICADO DE CAPA EXISTENTE, CAPA ESTABILIZADA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4,114.95 METROS CÚBICOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A IXHUAPAN PERTENECIENTE AL EJIDO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+410 AL KM 0+910, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 0+660 (PUENTE VADO)

NO. DE OBRA

04842019000075

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TATAHUICAPAN DE JUAREZ

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

OLMECA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-007/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 1,428,528.34

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

100.00%

AVANCE FINANCIERO

96.97%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 1,428,528.34

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2019

\$ 1,385,230.81

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

TERRACERÍAS (AFINAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE LOS ACCESOS DE ESTRUCTURA, INCLUYE REMOCIÓN DE MATERIALES PARA PERFILAR LAS SECCIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN MATERIAL TIPO C), CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO VADO (CONCRETO CICLÓPEO EN MUROS, CONCRETO HIDRÁULICO LIGERO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO).



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+800

NO. DE OBRA

04842019000014

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

ACTOPAN

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

CAPITAL

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-005/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 23,086,729.97

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

54.88%

AVANCE FINANCIERO

51.53%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 23,086,729.97

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2019

\$ 11,896,300.59

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

PRELIMINARES (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (RIEGO DE IMPREGNACIÓN, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS, BACHEO PROFUNDO EN TRAMOS AISLADOS), SEÑALAMIENTO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+500

NO. DE OBRA

04842019000046

LOCALIZACIÓN

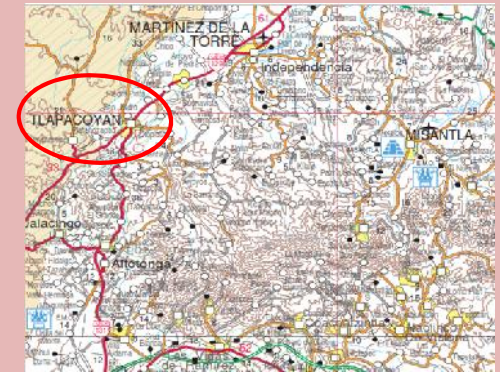

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TLAPACOYAN

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

NAUTLA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-012/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 14,723,761.80

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

54.57%

AVANCE FINANCIERO

25.65%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 14,723,761.80

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2019

\$ 3,776,115.56

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE TALUDES), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO, BORDILLOS, LAVADEROS), PAVIMENTOS (DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CORTE DE CAPA EXISTENTE, SUB BASE DE 15 CM DE ESPESOR, RECUPERACIÓN EN FRÍO DE CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM, CARPETA ASFÁLTICA), SEÑALAMIENTO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100

NO. DE OBRA

04842019000030

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

SAN ANDRÉS TUXTLA

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LOS TUXTLAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SI OP-OP-PF-006/2019-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 19,798,271.53

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

24.05%

AVANCE FINANCIERO

3.50%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 19,798,271.53

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2019

\$ 693,635.60

FECHA DE CORTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

TERRACERÍAS (DESPALMES, CORTES, TERRAPLENES), OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TIPO CAJÓN Y TUBULARES DE CONCRETO, VADO MONOLITICO CONSTRUIDO A NIVEL DE CAUCE, CUNETAS, BORDILLOS), PAVIMENTOS (SUBBASE HIDRÁULICA DE 24 CM DE ESPESOR, RIEGO E IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM), SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA, DEL KM. 1+500 AL KM. 2+570.

NO. DE OBRA
04842018000157

LOCALIZACIÓN

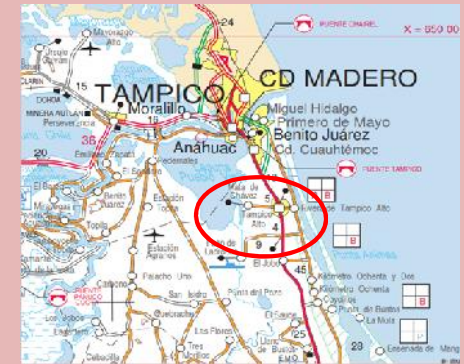

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TAMPICO ALTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-189/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN HUASTECA ALTA

COSTO DEL CONTRATO \$ 5,854,840.68

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

AUTORIZADO EN 2019 \$ 5,854,840.68

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2019 \$ 5,854,840.68

FECHA DE CORTE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS
TERRACERIAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO), DRENAJE Y SUBDRENAJE (CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, LAVADEROS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), PAVIMENTOS (RECORTES DE CAPAS EXISTENTES EN UN ESPESOR DE 33 CENTÍMETROS, CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 1,367 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS DEL KM. 2+300 AL KM. 5+300.

NO. DE OBRA
04842018000169
04842019000066

LOCALIZACIÓN

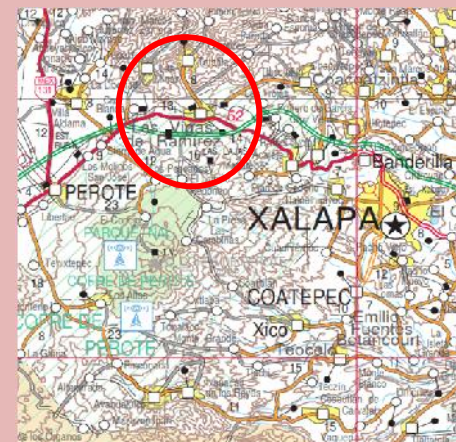

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	VARIOS
-----------	--------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-191/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD	VARIAS
-----------	--------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 13,754,845.00
--------------------	------------------

REGIÓN	CAPITAL
--------	---------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	100.00%
-------------------	---------

AUTORIZADO EN 2019	\$ 13,754,845.00
--------------------	------------------

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
------------------	--

DEVENGADO EN 2019	\$ 13,754,845.00
-------------------	------------------

FECHA DE CORTE	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
----------------	-------------------------

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3RA. CLASE, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL FILTRO Y DRENES DE PVC DE 4 PULGADAS), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAÚLICO), PAVIMENTOS (RECORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 5 CENTÍMETROS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 3,240 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM. 9+000 AL KM. 18+000.

NO. DE OBRA
04842018000126

LOCALIZACIÓN

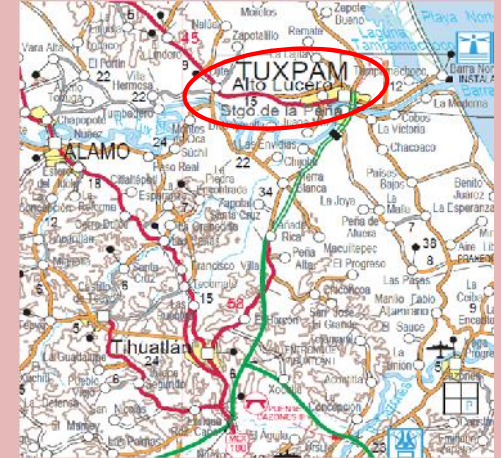

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TUXPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PE-142/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 42,697,771.70

REGIÓN HUASTECA BAJA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018 \$ 42,697,284.87

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO EN 2019 \$ 486.83

DEVENGADO EN 2019 \$ -

FECHA DE CORTE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO EN CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE, SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO), SEÑALAMIENTO (PINTURA DE RAYA SENCILLA Y DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES Y CONTINUA EN ORILLA DE CALZADA), SEÑALES PREVENTIVA, RESTRICTIVA E INFORMATIVA.




OBRA TERMINADA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500.

NO. DE OBRA
04842018000019

LOCALIZACIÓN

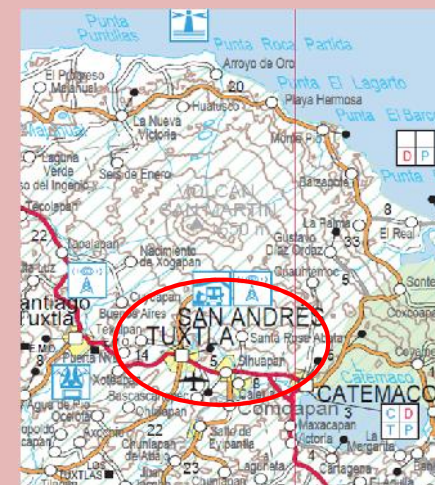

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO SAN ANDRÉS TUXTLA

LOCALIDAD VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-008/2018-DGCCYCE

REGIÓN LOS TUXTLAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 26,322,465.67

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018 \$ 25,036,163.55

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO EN 2019 \$ 1,035,361.84

DEVENGADO EN 2019 \$ 1,035,361.84

FECHA DE CORTE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CUNETAS), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR), SEÑALAMIENTO.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
CORTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018	APROBADO 2019 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
04842018000172 04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 12+770, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO.	SIOP	0.00	24,344,279.69	100.00%	100.00%
04842019000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN.	SIOP	0.00	23,086,729.97	54.88%	51.53%
04842019000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.	SIOP	0.00	19,798,271.53	24.05%	3.50%
04842019000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN.	SIOP	0.00	14,723,761.80	54.57%	25.65%
04842018000169 04842019000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS DEL KM. 2+300 AL KM. 5+300, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	0.00	13,754,845.00	100.00%	100.00%
04842018000157	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA, DEL KM. 1+500 AL KM. 2+570, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO.	SIOP	0.00	5,854,840.68	100.00%	100.00%
04842019000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A IXHUAPAN PERTENECIENTE AL EJIDO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+410 AL KM 0+910, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 0+660 (PUENTE VADO), EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ.	SIOP	0.00	1,428,528.34	100.00%	96.97%
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.	SIOP	25,036,163.55	1,035,361.84	100.00%	100.00%
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM. 9+000 AL KM. 18+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN.	SIOP	42,697,284.87	486.83	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL	67,733,448.42	104,027,105.68		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
