

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

MEJORAMIENTO Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL (TERMINACIÓN).

NO. DE OBRA

00132019000053

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEMPOAL

LOCALIDAD

BUENOS AIRES

REGIÓN

HUASTECA ALTA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

FISE_2019_00132019000053_IR

COSTO DEL CONTRATO

\$

2,925,981.68

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

55.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$

2,925,981.68

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

DEVENGADO EN 2020

\$

-

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

MÉTAS

TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC, HIDRÁULICO Y PIEZAS ESPECIALES PARA IRRIGACIÓN (TEE, CODO, COPLA, CRUZ Y VÁLVULAS), PRUEBA DEL SISTEMA.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PANTLA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA (TERMINACIÓN).

NO. DE OBRA

00132019000071

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TLACOTEPEC DE MEJÍA

LOCALIDAD

PANTLA

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

FISE_2019_00132019000071_IR

COSTO DEL CONTRATO

\$ 2,921,390.83

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

55.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$ 2,921,390.83

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

31 DE ENERO DE 2020

METAS

TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO EN TERRENO, CONSTRUCCIONES DE CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, ACARREOS.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE ZACUALPAN (TERMINACIÓN).

NO. DE OBRA
00132019000070



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO ZACUALPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
FISE_2019_00132019000070_AD

LOCALIDAD PUEBLO VIEJO

REGIÓN HUASTECA BAJA

COSTO DEL CONTRATO \$ 2,923,256.93

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 47.00%

AVANCE FINANCIERO 0.00%

AUTORIZADO EN 2020 \$ 2,923,256.93

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

METAS
TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO EN TERRENO, CONSTRUCCIONES DE CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, ACARREOS.




DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE (TERMINACIÓN).

NO. DE OBRA
00132019000061

LOCALIZACIÓN

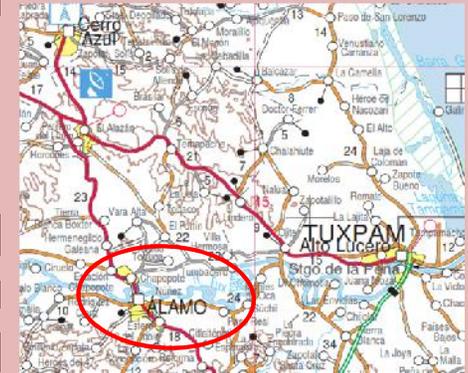

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO ÁLAMO TEMAPACHE

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
FISE_2019_00132019000061_IR

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 4,990,769.38

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 45.00%

AVANCE FINANCIERO 0.00%

AUTORIZADO EN 2020 \$ 4,990,769.38

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2020

MÉTAS

TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO EN TERRENO, CONSTRUCCIONES DE CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO, ACARREOS.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA					
00132019000061	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE (TERMINACIÓN), EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE.	SEDARPA	0.00	4,990,769.38	45.00%	0.00%
00132019000053	MEJORAMIENTO Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TEMPOAL.	SEDARPA	0.00	2,925,981.68	55.00%	0.00%
00132019000070	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE ZACUALPAN (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	SEDARPA	0.00	2,923,256.93	47.00%	0.00%
00132019000071	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PANTLA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE PANTLA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA.	SEDARPA	0.00	2,921,390.83	55.00%	0.00%
		SUB-TOTAL:	0.00	13,761,398.82		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.
